



GOBERNACIÓN
de BOLÍVAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

1. Metas fijadas en el plan de desarrollo 2024 -2027.

LINEA ESTRATEGICA 6: Bolívar Me Enamora con Atención a Víctimas.

PROGRAMA: Atención, Asistencia y reparación integral a las Víctimas.

Indicador de Resultado	Meta Resultado Cuatrenio 2027	Avance Meta Resultado a 30 sept/24	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24
Categoría del Índice de Incidencia del Conflicto Armado - IICA	0,044	0	Centros regionales de atención a víctimas construidos	1	numero	0	0
Categoría del Índice de Incidencia del Conflicto Armado - IICA	0,044	0	Dotación de infraestructura en la cual se reúne la oferta institucional del nivel nacional y territorial que tiene como objetivo atender, orientar, remitir y acompañar a las víctimas del conflicto.	1	numero	0	0
Categoría del Índice de Incidencia del Conflicto Armado - IICA	0,044	0	Puntos de atención a víctimas dotados	4	numero	0	0

No se programó ejecución de las metas productos en la vigencia 2024.



LINEA ESTRATEGICA 1: Bolívar me enamora con Crecimiento Economico y oportunidad de empleo para todos.

PROGRAMA: Infraestructura red vial regional.

Meta Producto: Vía terciaria mejorada.

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24	% Avance Meta Plan de Accion a Sept 30/24
Red vial a cargo del departamento por cada 100.000 habitantes	Vía terciaria mejorada	200	Km	40	57,65	100%

En cumplimiento de la ejecución de la meta programada para el año 2024 se han intervenido 57.65 Km de vías terciarias, mediante la ejecución de los siguientes proyectos:



Nombre del Proyecto: Mejoramiento en concreto asfaltico de la vía que conduce del municipio de Río Viejo hasta el municipio de Tiquisio.

Objetivo: Mejorar la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Río Viejo y el Municipio de Tiquisio.

Inversión: \$ 106.440.000.000

L = 16 Km

% Avance: 12%

No se reporta en indicador de producto.



Nombre del Proyecto: Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que comunica al municipio de hatillo de loba con el corregimiento de botón de Leiva jurisdicción del municipio de margarita departamento de Bolívar.

Objetivo: Mejorar la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Hatillo de Loba y el corregimiento de Botón de Leiva en el Municipio de Margarita en el Departamento de Bolívar.

Inversión: \$ 134.603.432.933

L = 38.4 Km

% Avance: 100%

Se reportan 30,72 km en el indicador de producto.



DATOS GENERALES				
PROYECTO	SECTOR	ENTIDAD	LOCALIDAD	AL. 1984
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA CON EL CORREGIMIENTO DE BOTÓN DE LEIVA	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	BOGOTÁ	1984
PROYECTO	SECTOR	ENTIDAD	LOCALIDAD	AL. 1984
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE HATILLO DE LOBA CON EL CORREGIMIENTO DE BOTÓN DE LEIVA	TRANSPORTES	DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	BOGOTÁ	1984



Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce de la cabecera municipal de Córdoba al corregimiento de san Andrés, municipio de Córdoba.


Objetivo: Mejorar la intercomunicación terrestre de la vía que conduce del Municipio de Córdoba al Corregimiento de San Andres en el Departamento de Bolívar.

Inversión: \$ 84.211.000.000

L = 11,4 Km

% **Avance:** 60%

Se reportan 6,84 km en el indicador de producto.

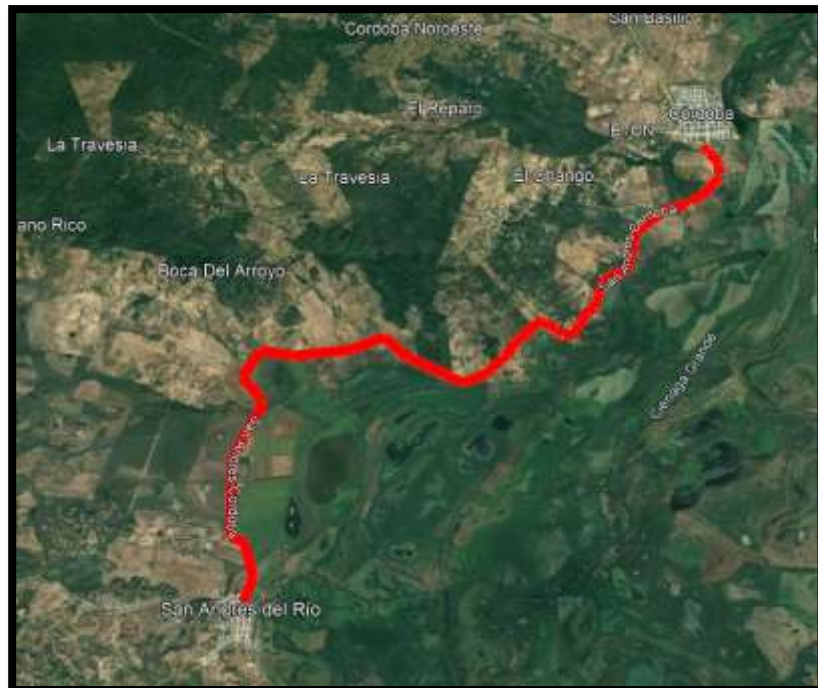

Nombre del Proyecto: Mejoramiento en pavimento flexible de la vía Soplaviento - san Cristóbal y conexión con la vía que conduce del municipio de Soplaviento al municipio de Mahates, departamento de Bolívar.



Objetivo: Mejorar la intercomunicación terrestre entre las cabeceras municipales de Soplaviento y San Cristóbal.

Inversión: \$ 36.593.733.576,48

L = 12.8 Km

% Avance: 100%

Se reportan 10,25 km en el indicador de producto.

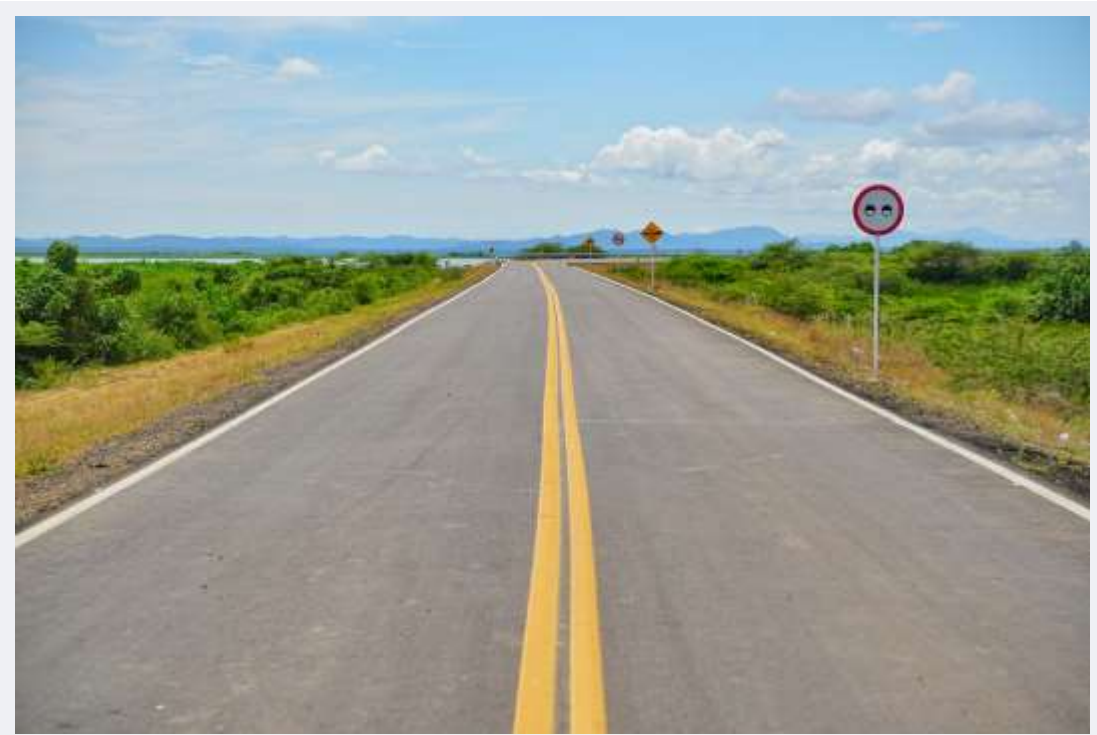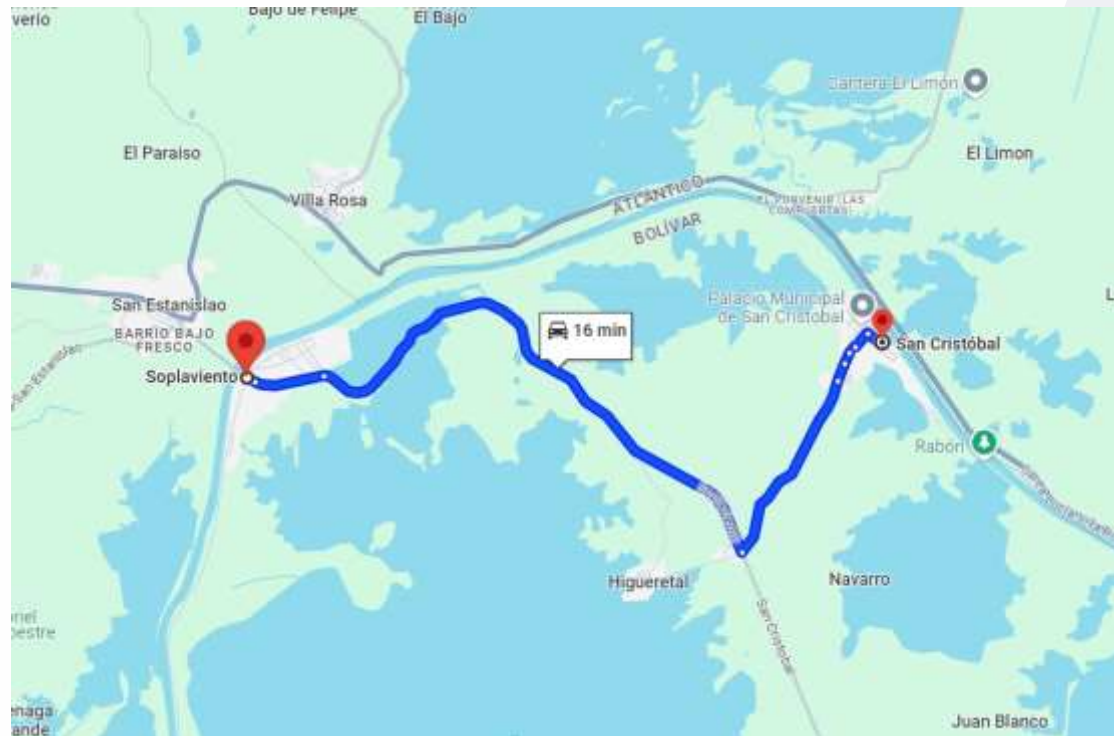

Nombre del Proyecto: Mejoramiento En Pavimento Flexible Del Corredor Vial Entre El Municipio De Arroyo Hondo El Corregimiento De Hatoviejo (Municipio De Calamar) Y La Vereda Las Cruces (Municipio De San Cristóbal) En El Departamento De Bolívar.


Objetivo: Mejorar la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Arroyohondo el corregimiento de Hato viejo (Municipio de Calamar) y la Vereda las cruces (Municipio de San Cristóbal) en el Departamento de Bolívar.

Inversión: \$ 70.854.021.727,00

L = 16.35 Km

% Avance: 40%

No se reporta en indicador de producto.

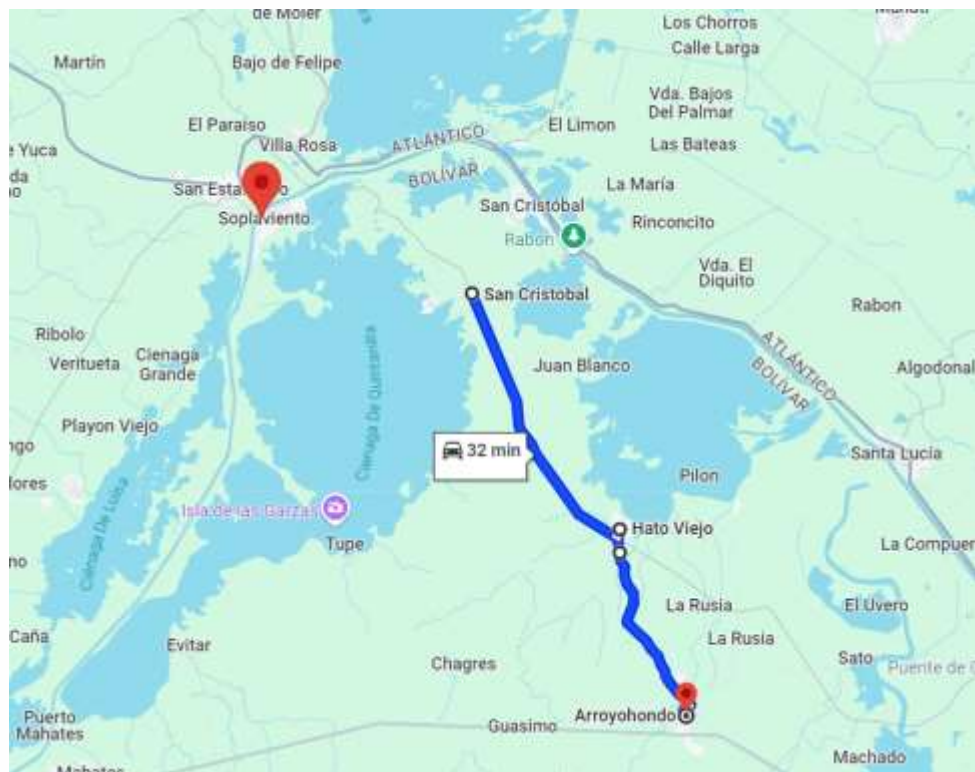

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de morales al corregimiento de la palma (permitiendo la conectividad con los municipios de arenal y rio viejo) departamento de bolívar.


Objetivo: Mejorar la intercomunicación terrestre entre el Municipio de Morales y el Corregimiento de La Palma que permite la conectividad con Arenal y Rio Viejo en el Departamento de Bolívar.

Inversión: \$74.999.727.011,00

L = 20.1 Km

% Avance: 10%

No se reporta en indicador de producto.

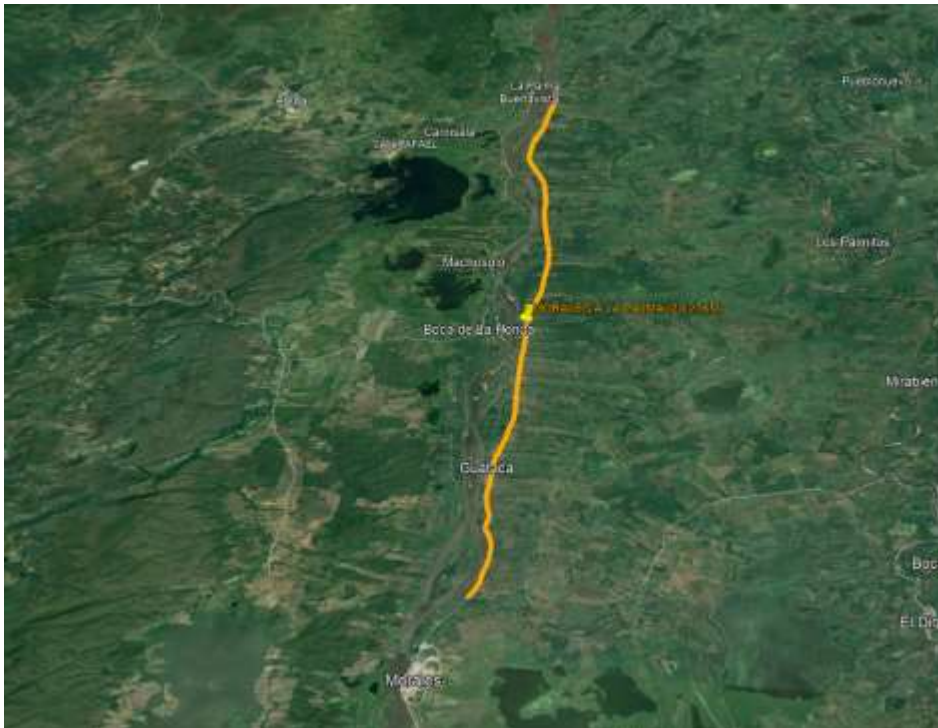

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de Magangué hasta el municipio de Córdoba en el tramo comprendido entre Betania y la pascuala en el departamento de Bolívar.


Objetivo: Mejorar la intercomunicación terrestre desde el Municipio de Magangué al Municipio de Córdoba en el tramo comprendido entre el corregimiento de la Pascuala al Corregimiento de Betania en el Departamento de Bolívar.

Inversión: \$ 8.000.000.00,00

L = 1.65 Km

% **Avance:** 80%

Se reportan 1,32 km en el indicador de producto.

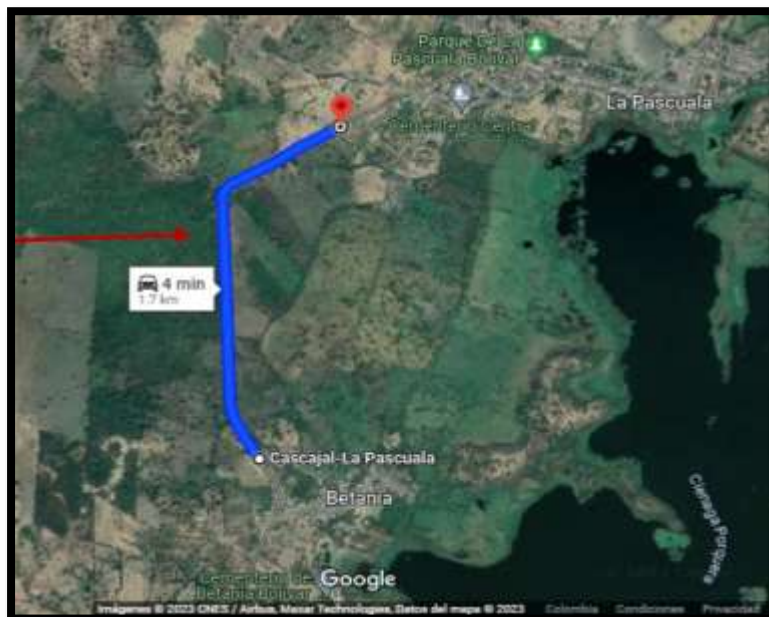

Nombre del Proyecto: Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de morales con la intersección de la Vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, en el municipio de Simití, del Departamento de Bolívar.



Objetivo: Mejorar la intercomunicación terrestre entre los Municipios de Morales y el Municipio de Simití en el Departamento de Bolívar.

Inversión: \$ 212.650.616.283,00

L = 41 Km

% Avance: 60%

Se reportan 8,52 km en el indicador de producto.

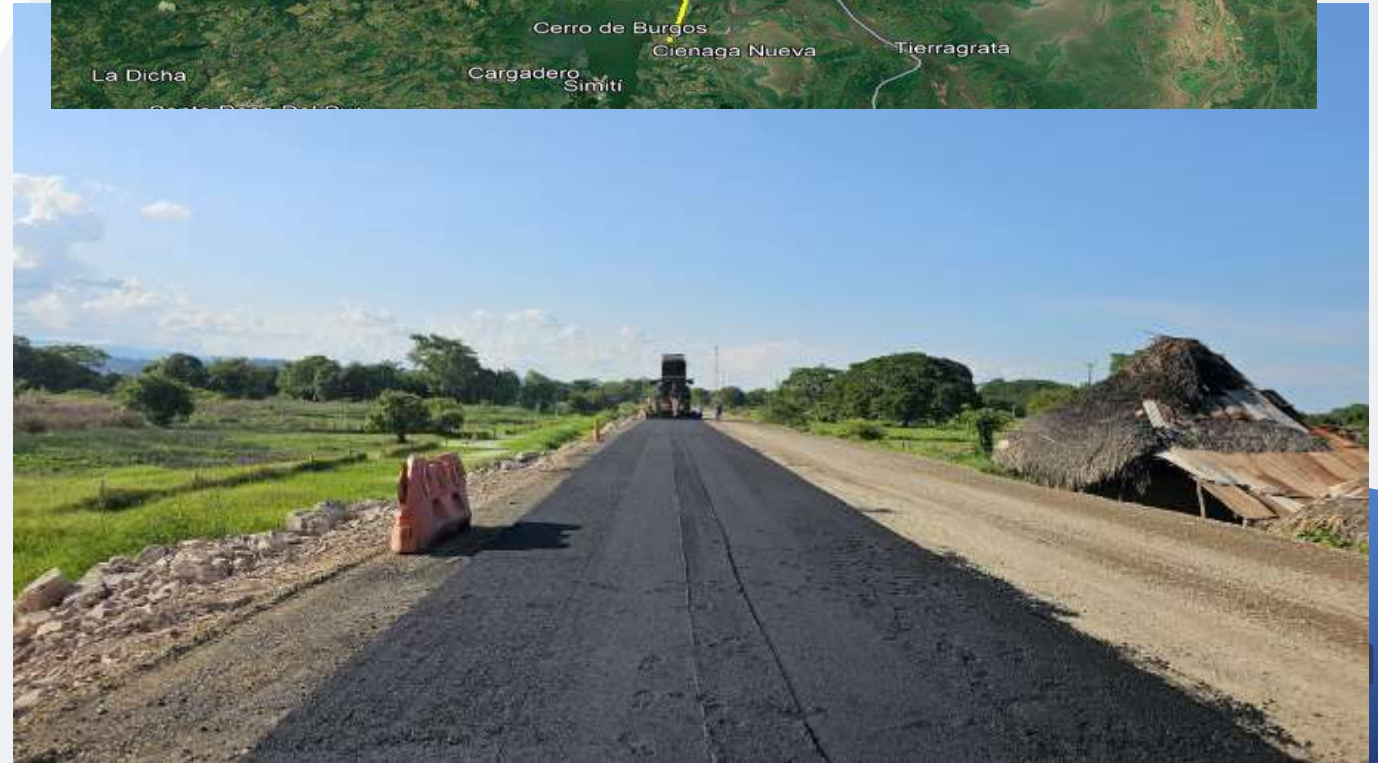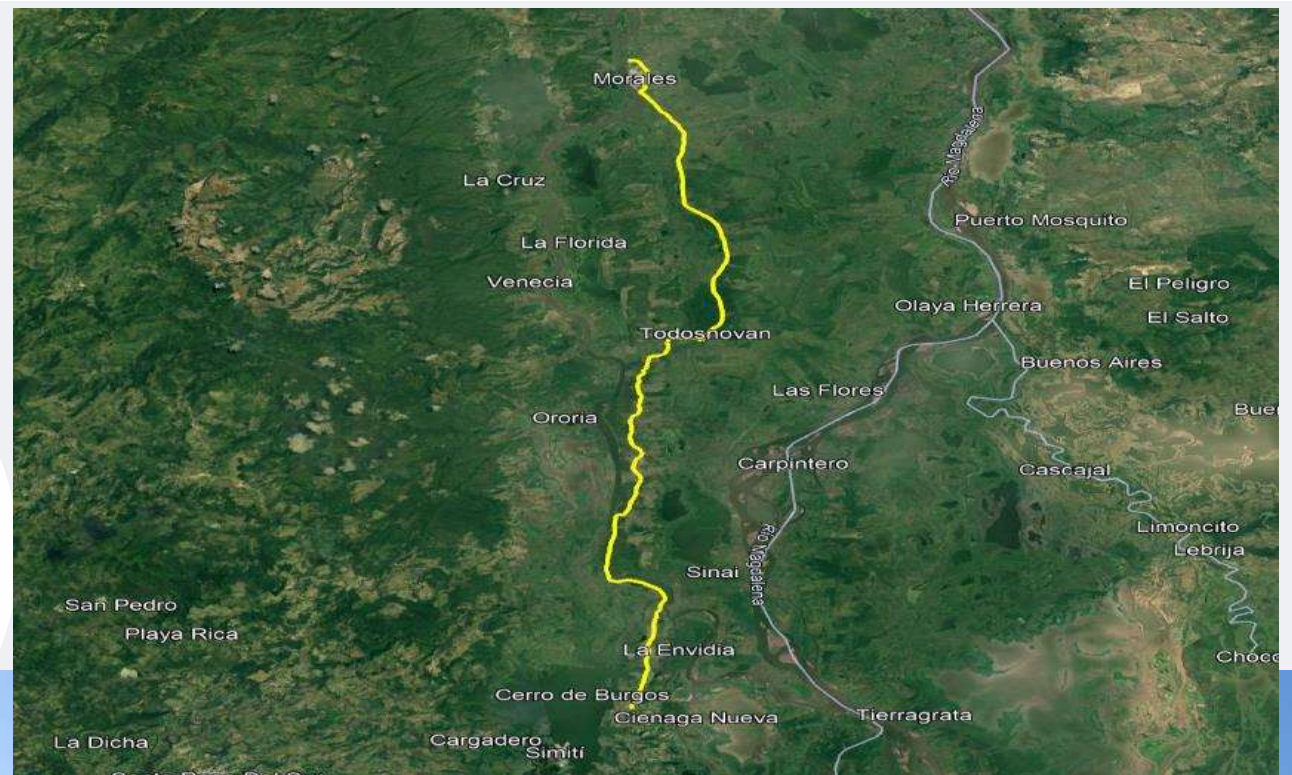

Línea Estratégica: Bolívar me enamora con Crecimiento Económico y oportunidad de empleo para todos.

Programa: Infraestructura red vial regional.

Producto: Vía secundaria mejorada.

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24
Red vial a cargo del departamento por cada 100.000 habitantes	Vía secundaria mejorada	12	km	0	0

No se programó ejecución de meta producto en la vigencia 2024.



Línea Estratégica: Bolívar me enamora con Crecimiento Económico y oportunidad de empleo para todos.

Programa: Infraestructura red vial regional.

Producto: Vía urbana construida.

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24	% Avance Meta Plan de Accion a Sept 30/24
Red vial a cargo del departamento por cada 100.000 habitantes	Vía urbana construida	30	Km	5	0	0

Para el cumplimiento de la ejecución de la meta programada para el año 2024 se vienen adelantando los siguientes proyectos:



Código BPIN: 2024002130082

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la malla vial de los barrios Centro Frontera y Arriba del Municipio de San Juan Nepomuceno Departamento de Bolívar.

Objetivo: Mejorar los niveles de movilidad del tránsito en el Municipio de San Juan Nepomuceno.

Inversión: \$6.999.825.209,84; Recursos SGR – Asignaciones Directas del Departamento de Bolívar.

L = 2.03 Km

Fecha de Aprobación del proyecto: (dd/mm/aaaa): 30/07/24

Mediante Resolución No 1808 del 30 de julio de 2024, se designó al municipio de San Juan Nepomuceno como ejecutor e interventor del proyecto.

Código BPIN: 2024002130084

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de calles y construcción de redes de alcantarillado del municipio de Magangue en el departamento de Bolívar.

Objetivo: Mejorar los niveles de movilidad del tránsito en el Municipio de Magangué.

Inversión: \$ 5.876.478.312; Recursos SGR – Asignaciones Directas del Departamento de Bolívar.

L = 620 metros

Fecha de Aprobación del proyecto: (dd/mm/aaaa): 14/08/24

Mediante Resolución No 2052 del 16 de agosto de 2024, se designó al municipio de Magangué como ejecutor e interventor del proyecto.



BOLÍVAR
Mejor

Código BPIN: 2024002130125

Nombre del Proyecto: Mejoramiento Integral de vías urbanas y rehabilitación de parques en el municipio de Mompos, departamento de Bolívar.

Objetivo: Mejorar la movilidad urbana en el tráfico vehicular del Municipio de Mompos.

Inversión: \$ 34.995.720.428,00

L = 3,5 Km

% Avance: Se encuentra en proceso de contratación para la ejecución del proyecto.

Código BPIN: 2024002130233

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la malla vial en el distrito de Cartagena de Indias.

Objetivo: Mejorar la movilidad urbana en el tráfico vehicular del Distrito de Cartagena de Indias.

Inversión: \$ 62.980.792.331,00

L = 12 Km

% Avance: Se encuentra en proceso de contratación para la ejecución del proyecto.

Código BPIN: 2024002130245

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la malla vial del centro urbano del municipio de Magangué en el departamento de Bolívar.

Objetivo: Mejorar la movilidad urbana en el tráfico vehicular del Municipio de Magangué.

Inversión: \$ 26.000.000.000,00

L = 1,79 Km

% Avance: Se encuentra en proceso de contratación para la ejecución del proyecto.



BOLÍVAR
Mejor

Línea Estratégica: Bolívar me enamora con Crecimiento Económico y oportunidad de empleo para todos.

Programa: Infraestructura red vial regional.

Producto: Estudios de preinversión realizados.

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24	% Avance Meta Plan de Acción a Sept 30/24
Red vial a cargo del departamento por cada 100.000 habitantes	Estudios de preinversión realizados	3	Numero de estudios	1	0	0

Para el cumplimiento de la ejecución de la meta programada para el año 2024 se vienen adelantando el siguiente proyecto:

Código BPIN: 2024002130073


Nombre del Proyecto: Estudios y diseños para el desarrollo de la infraestructura de transporte para la integración regional del Departamento de Bolívar.

Objetivo: Construir infraestructura de transporte que garantice interconexión de municipios en los ZODES Norte, Montes de María y Loba; para facilitar la integración regional del sur con el centro y norte del departamento de Bolívar.


Inversión: \$ 9.799.496.654,00

% Avance: 50%



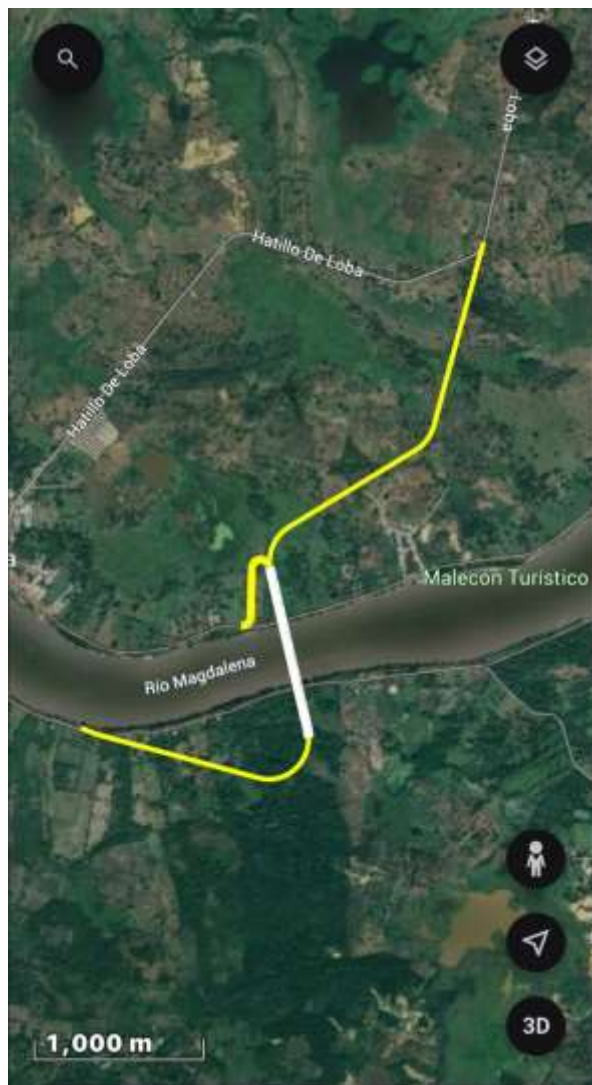

Puente Las Lobas

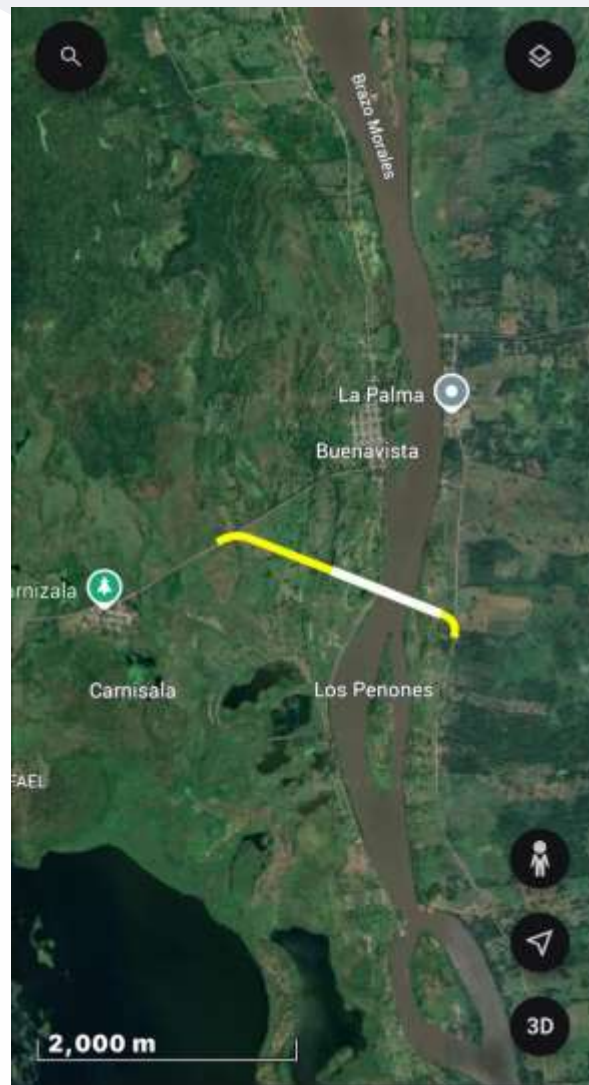

Puente La Palma - Buenavista



Puente Don Uriel - Morales



Puente Piedra Candela - Simiti

Línea Estratégica: Bolívar me enamora con Crecimiento Económico y oportunidad de empleo para todos.

Programa: Infraestructura red vial regional.

Producto: Puente construido en vía terciaria existente.

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24
Red vial a cargo del departamento por cada 100.000 habitantes	Puente construido en vía terciaria existente	2	Número de puentes	0	

No se programó ejecución de meta producto en la vigencia 2024



Línea Estratégica: Bolívar me enamora verde y sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia.

Programa: Ordenamiento ambiental territorial.

Producto: Cuerpos de agua recuperados.

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24
Porcentaje del Área de humedales	Cuerpos de agua recuperados	15	Hectáreas	0	

No se programó ejecución de meta producto en la vigencia 2024



Línea Estratégica: Bolívar me enamora verde y sostenible Transición energética y gestión ambiental de excelencia.

Programa: Ordenamiento ambiental territorial.

Producto: Protecciones de Orillas realizadas.

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24
Porcentaje en reducción del riesgo	Protecciones de Orillas realizadas	2	Numero de obras	0	0.15

No se programó ejecución de meta producto en la vigencia 2024.

Sin embargo, para el cumplimiento de la Meta Resultado se viene ejecutando el siguiente proyecto:

Código BPIN: 20232401060039


Nombre del Proyecto: Construcción de obras para el control y mitigación de la Erosion y del nivel de inundación del margen izquierdo del rio magdalena en el municipio de Magangue departamento de bolívar.

Objetivo: Disminuir los niveles de erosión producidos por el rio Magdalena en el Municipio de Magangue, Departamento de Bolívar

Inversión: \$ 57.092.467.944,00

% Avance: 15%



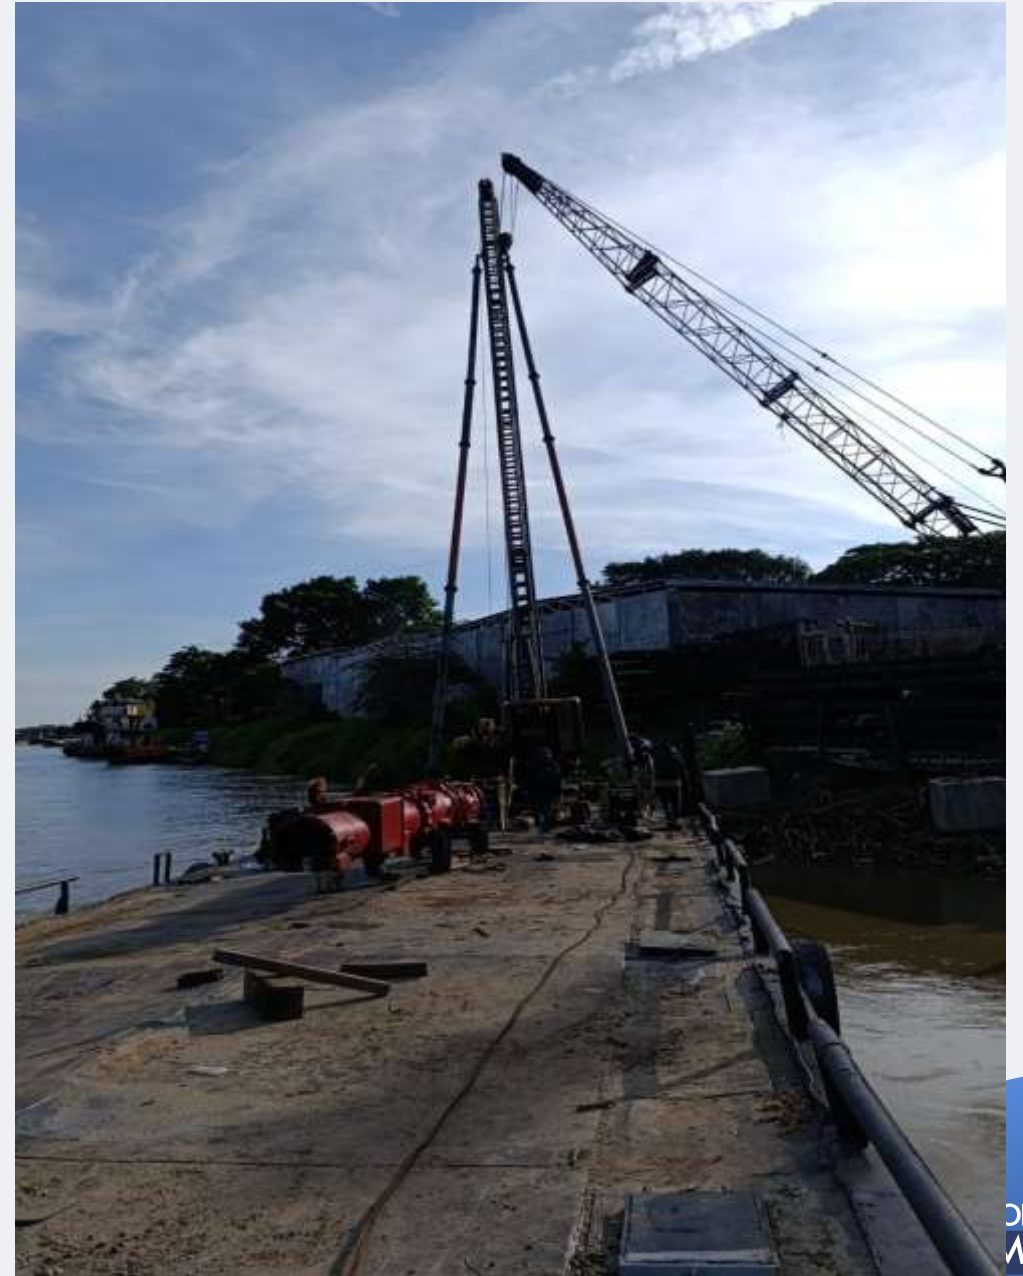

Línea Estratégica: Bolívar me enamora con justicia social Cierre de brechas y calidad de vida para todos.

Programa: Formación y preparación de deportistas.

Producto: Parques construidos.

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24	% Avance Meta Plan de Accion a Sept 30/24
Numero de Infraestructuras deportivas y/o recreativos Mejoradas	Parques construidos	1	Numero de obras	1	0.7	70%

Para el cumplimiento de la Meta Resultado se viene ejecutando el siguiente proyecto:

Código BPIN: 2021002130269

Nombre del Proyecto: Construcción del centro recreacional el Edén ubicado en el barrio las gaviotas en el distrito de Cartagena de indias, departamento de Bolivar.

Objetivo: Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Barrio las Gaviotas y sus barrios aledaños.

Inversión: \$5.679.638.055,37

% Avance:70%





Línea Estratégica: Bolívar me enamora con justicia social Cierre de brechas y calidad de vida para todos.

Programa: Formación y preparación de deportistas.

Producto: Cancha mejorada.

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24	% Avance Meta Plan de Accion a Sept 30/24
Numero de Infraestructuras deportivas y/o recreativos Mejoradas	Cancha mejorada	1	Numero de obras	1	0.35	35%

Para el cumplimiento de la Meta Resultado se viene ejecutando el siguiente proyecto:

Código BPIN: 2022002130043

Nombre del Proyecto: Mejoramiento y adecuación del estadio 16 de agosto del municipio de Talaigua nuevo departamento de Bolívar.

Objetivo: Incrementar el desarrollo de actividades recreo deportivas individuales y en familia en el Municipio de Talaigua.

Inversión: \$ 7.899.995.891,00

% Avance: 45%





Línea estratégica: Bolívar me enamora con justicia social Cierre de brechas y calidad de vida para todos.

Programa: Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes.

Producto: Edificaciones para la atención integral a la primera infancia construidas

Indicador de Resultado	Indicador de Producto	Meta Producto Cuatrenio	Unidad de Medida	Valor esperado 2024	Avance Meta Producto a 30 de septiembre/24	% Avance Meta Plan de Accion a Sept 30/24
Establecimientos educativos que incorporan la formación integral.	Edificaciones de atención integral a la primera infancia construidas	12	Numero de edificaciones	2	0	0

Para el cumplimiento de la ejecución de la meta programada para el año 2024 se vienen adelantando los siguientes proyectos:

Código BPIN: 2024002130232

Nombre del Proyecto: Implementación para la terminación de los centrosde desarrollo infantil.

Objetivo: Mejorar el servicio de atención integral a niños y niñas deldepartamento de bolívar.

Inversión: \$ 20.000.000.000,00

% Avance:

- Se encuentra en proceso de contratación la Consultoría de Patología estructural para los municipios de Altos del Rosario, Cantagallo, Simití Y San Pablo.
- Adicionalmente, se encuentra en proceso de estructuración, la contratación para la terminación de los CDI de los municipios de l. Hatillo de Loba 2. Barranco de Loba 3. El Peñón 4. Río Viejo 5. Morales 6. Santa Rosa del Sur.



2. Incidencia en el presupuesto de la vigencia actual de acuerdo a su ejecución hasta el 30 de septiembre de 2024.

Código BPIN: 20201301010240

Nombre del Proyecto: Mejoramiento en concreto asfáltico de la vía que conduce del municipio de morales con la intersección de la Vía que conduce del municipio de Simití al corregimiento de Cerro de Burgos, en el municipio de Simití, del Departamento de Bolívar.

Apropiación Inicial: \$ 0

Adición: \$ 2.418.779.956,81

Apropiación Final: \$ 2.418.779.956,81

Obligaciones: \$ 533.736.783

Saldos: \$ 1.885.043.173,81

Recurso: DNP ENTERRITORIO

Código BPIN: 20201301012450

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la vía que conduce del municipio de córdoba al corregimiento de san Andrés en el departamento de Bolívar.

Apropiación Inicial: \$ 9.000.000.000,00

Adición: \$ 0

Apropiación Final: \$ 9.000.000.000,00

Obligaciones: \$ 7.751.693.082

Saldos: \$ 1.248.306.918

Recurso: ACPM



Código BPIN: 2022002130088

Nombre del Proyecto: Mejoramiento En Concreto Asfáltico De La Vía Que Conduce Del Municipio De Río Viejo Hasta El Municipio De Tiquisio, En El Departamento De Bolívar.

Apropiación Inicial: 0

Adición: \$ 9.000.000.000,00

Apropiación Final: \$ 9.000.000.000,00

Obligaciones: \$ 0

SalDOS: \$ 9.000.000.000,00

Recurso: INVIAS

Código BPIN: 2024002130073

Nombre del Proyecto: Estudios Y Diseños Para El Desarrollo De La Infraestructura De Transporte Para La Integración Regional Del Departamento De Bolívar.

Apropiación Inicial: 0

Adición: \$ 9.799.496.654

Apropiación Final: \$ 9.799.496.654

Obligaciones: \$ 2.939.848.996

SalDOS: \$ 6.859.647.658

Recurso: ICLD

Código BPIN: 2023002130152

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento Institucional de la secretaria de infraestructura para la vigencia 2024 de la gobernación del departamento de Bolívar - (Honorarios)

Apropiación Inicial: \$ 1.000.000.000

Crédito: \$ 200.000.000

Apropiación Final: \$ 1.200.000.000

Obligaciones: \$ 761.000.000

SalDOS: \$ 439.000.000

Recurso: ICLD



BOLÍVAR
Mejor

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FIN	% EJC	VALOR TOTAL	FUENTE
2786-2021	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS PDET	2024-10-26	84%	\$ 88.317.191.808	SGR
2817-2021	INTERVENTORÍA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS PDET	2024-10-26	84%	\$ 4.861.174.870	SGR
2697-2021	CONSTRUCCIÓN DE SUBSEDE MULTISECTORIAL SENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ	2024-12-25	85%	\$ 23.338.904 769	SGR
3012-2021	INTERVENTORÍA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBSEDE MULTISECTORIAL SENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE	2024-12-25	85%	\$ 1.636.668 800	SGR
4303-2023	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO 16 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	2024-12-27	45%	\$ 6.627.534 667	SGR
4816-2023	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO 16 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE TALAIGUA NUEVO	2024-12-27	45%	\$ 456.872.958	SGR
LIC-SI-001-2024	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ	2025-09-10	23.73%	\$ 54.738.999 989	SGR

CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FIN	% EJE	VALOR TOTAL	FUENTE
CMA-SI-001-2024	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE LA EROSIÓN Y DEL NIVEL DE INUNDACIÓN DEL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE MAGANGÜÉ	2025-09-10	23.73%	\$ 1.529.262 643	SGR
2678-2023	MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE RIO VIEJO HASTA EL MUNICIPIO DE TIQUISIO	2029-12-31	23%	\$ 115.043.785.253	INVIAS
4855-2023	CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL EL EDEN UBICADO EN EL BARRIO LAS GAVIOTAS EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	2024-12-27	70%	\$ 5.679.638 055	Excedentes Empréstito Findeter
4854-2023	INTERVENTORÍA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREACIONAL EL EDEN UBICADO	2024-12-27	70%	\$ 422.117.555	Excedentes Empréstito Findeter
TOTAL, INVERSIÓN				\$303.482.587.599.28	



Nombre del Proyecto: Construcción de subsede Multisectorial SENA, en el municipio de Magangué.

Inversión: \$ 23.338.904.769,07

% Avance: 80%



Nombre del Proyecto: Construcción Puentes para la estabilización de los municipios PDET Departamento de Bolívar.

Inversión: \$ 88.317.191.108,97

% Avance: 85%



BOLÍVAR
Mejor





